

仙台市役所新本庁舎第一期建設工事の進捗お知らせ

2025（R7）. 6. 末

地下階の床コンクリート打設が約1/3完了しました。8月末まで引き続き打設が行われます。


低層部で採用した地中熱を利用した空調に付随する配管敷設作業を進めています。

基礎の鉄筋工事が約半分まで完了しました。

市民広場側では、地下連絡通路整備に必要な、掘削工事を進めています。

【 地中熱配管工事 】

地下東エリアでは、掘削工事後に低層部の一部で空調利用する地中熱配管（ループコイル）の敷設作業を進めています。地中の安定的な温度を利用することにより低エネルギーの空調を実現します。

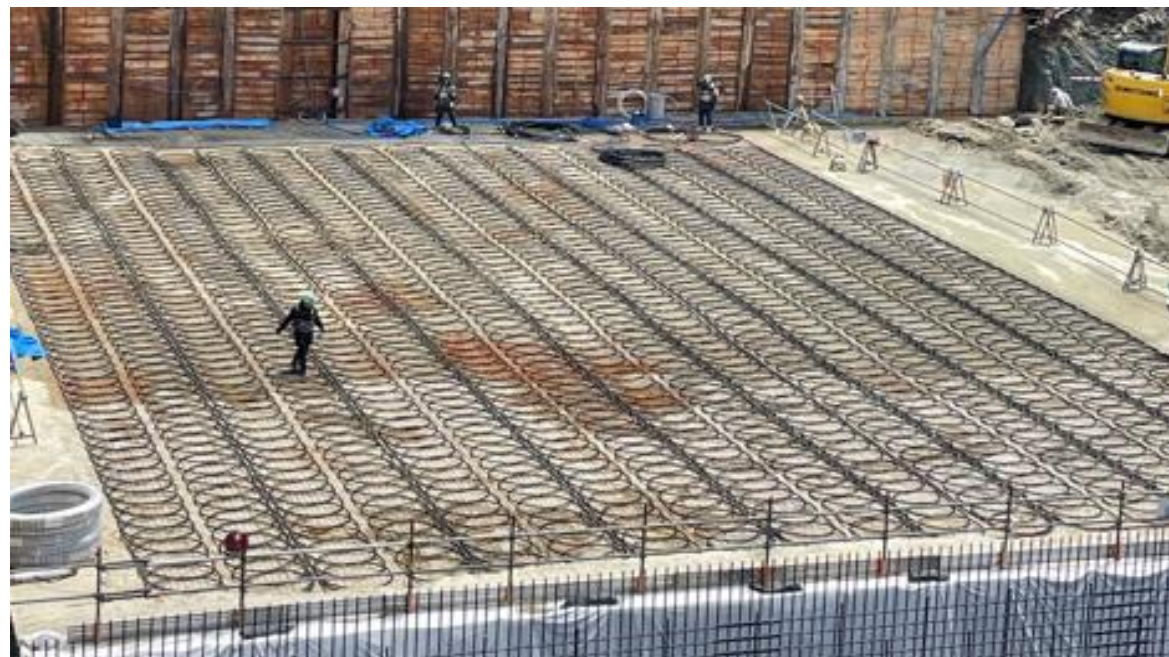

【低層部市民ワークショップ「フューチャーセッション」を開催】

市役所新本庁舎の整備にあたり、周辺エリアとのにぎわいの相互波及やまちの回遊性向上を図るため、その低層部には民間活力を導入し、市民等が日常的に利用できる機能を設けることとしています。



🌿🌿🌿🌿🌿
R7. 5. 31（土）と6. 21（土）に市役所新本庁舎の低層部について市民の皆さまと共に考えるワークショップ「フューチャーセッション」を開催しました。参加者からは「気軽に訪れることのできる市役所になってほしい」等の意見が挙がりました。
