

仙台市役所新本庁舎第一期建設工事の進捗お知らせ

2025 (R7) . 8. 末



【タワークレーン組立てが完了しました！】




2台目のタワークレーン組立てが完了しました。これからは2台のタワークレーンで鉄骨工事やその他工事の資材揚重を行っていきます。
操縦席までの高さは地上約45m！
今の高さは来年の5月頃までです。本庁舎8階から見ると操縦席が見える？
かもしれません。ぜひ足を運んでかっこいいタワークレーンを見に来てください。

【地下の立上り躯体工事が着々と進んでいます！】

地下の柱・梁などの主要構造物を造る工事が進んでおり、現場の状況が日々変わっていています。地下はSRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造とRC(鉄筋コンクリート)造の2種類で構築されます。9月からは免震階床の構築、10月からは免震装置の設置工事が始まります。造っている過程は今しか見れません！



【発進立坑が完成！】

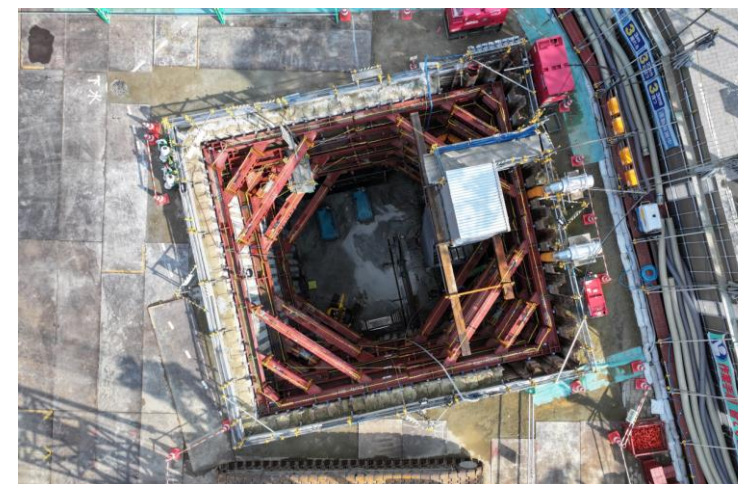

市民広場側で行っている「発進立坑を造るための掘削工事」が完了しました。深さは約15m！9月からは推進機の組立、10月からはいよいよ新本庁舎に向かって掘削を開始します。（道路の下にトンネルを造るイメージです）
