


仙台市役所新本庁舎第一期建設工事の進捗お知らせ

2025（R8）.1.末



【地下鉄駅構内の工事を進めています】

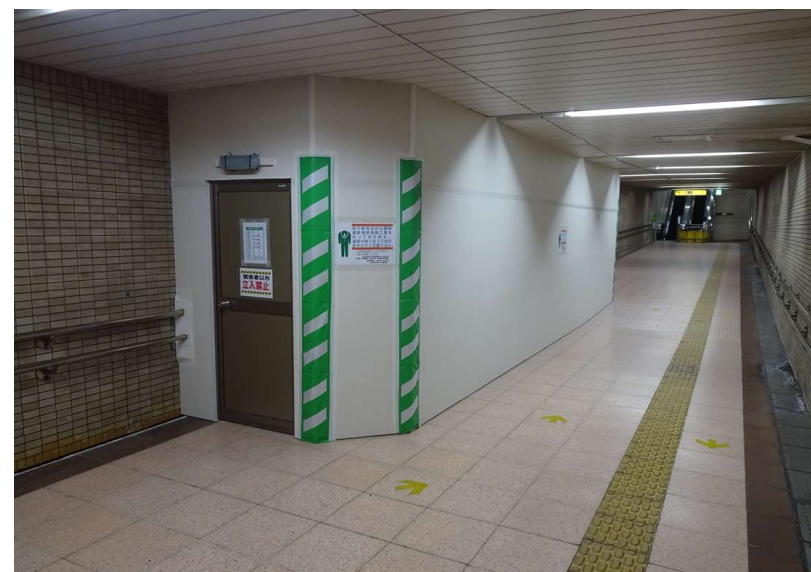

現在、地下鉄構内との接続にあたり勾当台駅構内の壁を解体する工事等に着手しております。その影響で勾当台公園駅構内の通路に仮囲いを設置しており通路の一部が狭くなっております。

令和8年2月から本格的に既設の壁を撤去を開始して、令和8年4月末頃に既設壁の撤去が完了する予定です。

仮囲いは令和9年3月頃までを予定しており長期に渡りご迷惑おかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

【地下連絡通路の推進機が貫通しました】



市民広場側から新本庁舎側へ向けて地中で推進機による掘進とボックスカルバートの設置工事を進めてきました。

令和7年11月中旬から掘進を開始して、令和8年1月上旬に新庁舎まで到達しました。2月上旬には推進機が貫通して、地中から出てきます。

その後、ボックスカルバートの仕上げ工事を行って、推進工事が完了します。

※写真は、掘進機が貫通し、地下連絡通路が貫通したときの様子を写したものです。
