


仙台市役所新本庁舎第一期建設工事の進捗お知らせ

2025 (R8) . 2. 末



【地上階の鉄骨工事に着手しました】

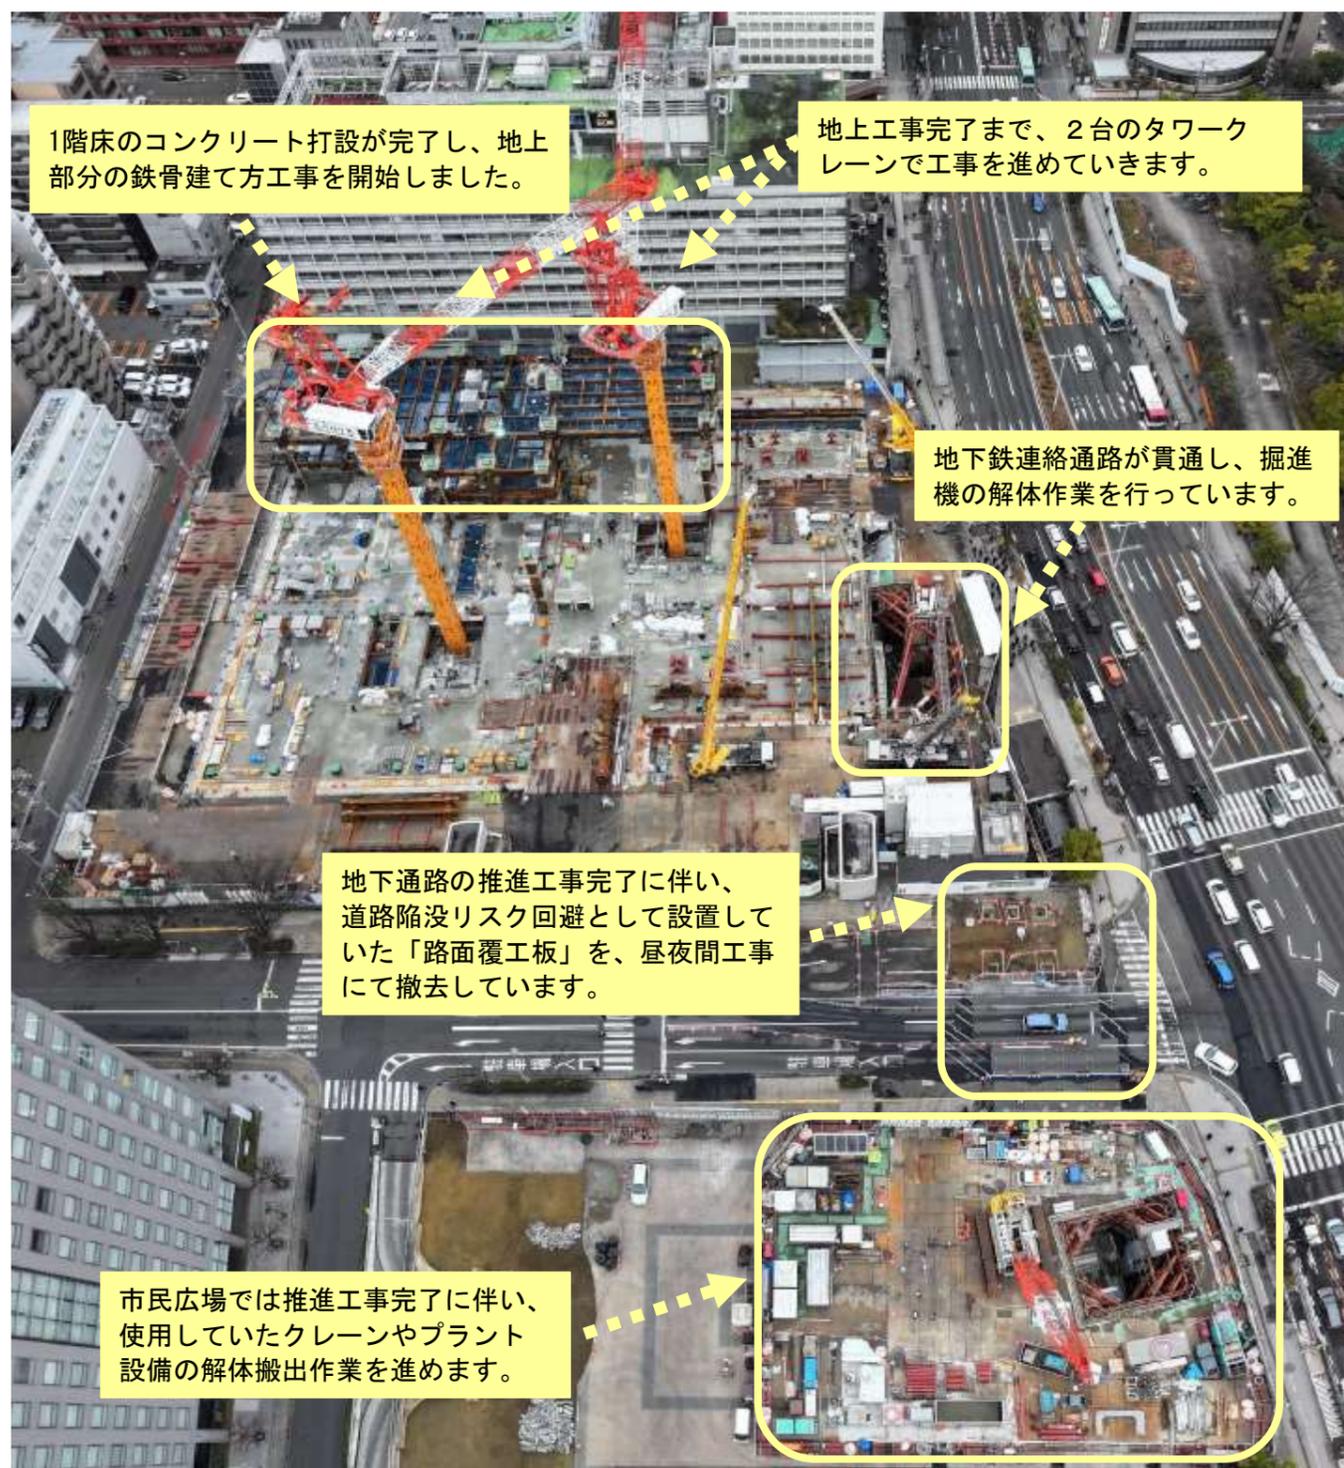


2月17日(火)に立柱式を実施し、いよいよ地上部分の主要構造である鉄骨工事がスタートしました。高層棟は約10ヵ月かけて地上約80mまで鉄骨を積み上げていきます。

4月頃からは外部足場の組立工事や、地上階の床コンクリート打設工事も始まります。

工事が着手してから1年半程度かけて庁舎土台部分の工事を進めてきましたが、ここから工事が加速して外から見える工事の様子も目に見えて変わってきます。

【地下階の工事も進めています】

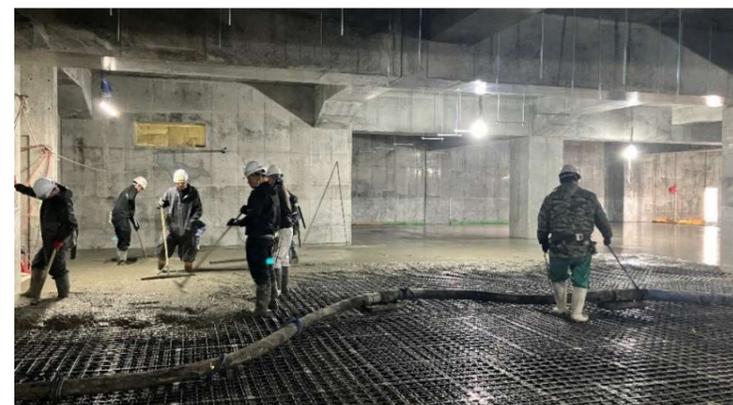

地上階の工事が進んでいることで航空写真上では見えなくなった地下階も工事を進めています。コンクリート打設から養生期間を経て、打設時に使用した型枠や支保工が解体され、地下1階の姿が見えてきました。

現在は床部分の嵩上げコンクリート工事を進めており、実際の床となる部分を構築する工事を進めています。

新庁舎では主に駐車場として使用する部分であり、市民広場下にある勾当台公園地下駐車場と接続される計画です。
