

仙台市役所新本庁舎第一期建設工事の進捗お知らせ

2026 (R8) . 5. 末

地上6階、7階部分の鉄骨建方がほぼ完了し、6月中旬から8階、9階部分の鉄骨建方を開始します。2～6階では鉄筋・コンクリート工事が進み「床」が出来上がってきています。

地上工事完了まで、2台のタワークレーンで工事を進めていきます。5月末から6月初旬に高層工事に対応できるようクレーンの高さを上げていきます。

地下鉄連絡通路の掘削工事が新本庁舎側に到達し、庁舎との接続部分の工事を進めています。

鉄骨工事の進捗に合わせて外部仕上げ工事に使用する外部足場の組み立てが各面で進んでいます。


勾当台公園駅との接続部の壁解体工事が完了しました。勾当台公園駅との接続部分の工事を進めています。

【仕上げ工事（耐火被覆、ウレタン吹付けなど）も進んでいます】



免震層階では、耐火被覆・ウレタンの吹付け工事が進んでいます。
耐火被覆は火災から建物を守るために、燃えない材料で鉄骨を覆うものです。
ウレタンは室内の温度を保つために必要な仕上げ工事で室内の結露を防ぐほか断熱性を高めるために必要な内装工事です。
今後は設備配管、電気配線など進めていく予定です。また、免震階以外のフロアも同様の工事や内装壁構築など進めていきます。

【現本庁舎電光時計のパネル展示を行いました】

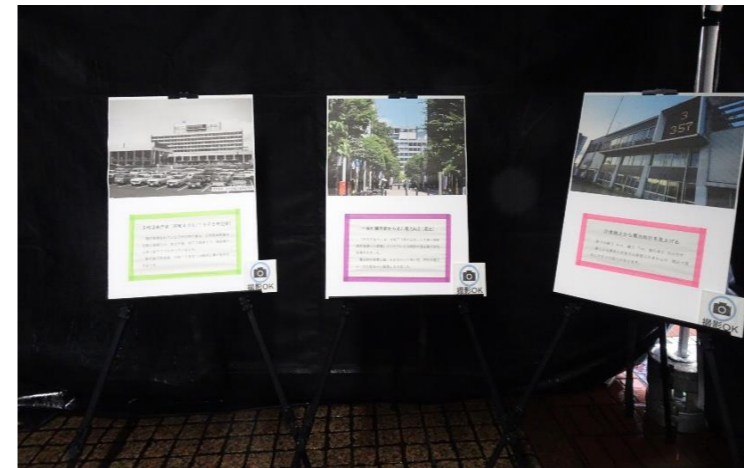

5月1、2日の2日間にわたり一番町四丁目商店街で開催された「Bang BAR SENDAI」（バンバルセンダイ）Vol. 10にて本庁舎電光時計等のパネル展示を行いました。
新本庁舎建設工事の進捗に伴い、電光時計は現本庁舎南側に建設中の新本庁舎の背後に隠れ、見える場所が限られてきています。当日は「ありがとう 市役所本庁舎 電光時計 —お別れのパネル展示—」と題して、パネル展示のほか、市役所新本庁舎の模型展示、電光時計や市役所本庁舎に対するメッセージ記入ブース、こども向けの塗り絵ブースを設けました。
