




-----工事進捗状況を報告します-----

現在は、**新橋(北側)**および**伸友橋歩道橋**の橋台の施工を行なっています。  
 今後、**河川護岸**の施工に入る予定です。

○工事件名：郡山折立線(大野田工区)外1線 仮橋撤去・橋梁下部工工事  
 ○工期：令和7年7月まで(予定) 作業時間：8時30分～17時00分  
 ※作業状況により前後することがあります。

○工事内容：仮橋撤去、新橋(北側)及び伸友橋歩道橋の橋台、河川護岸の施工

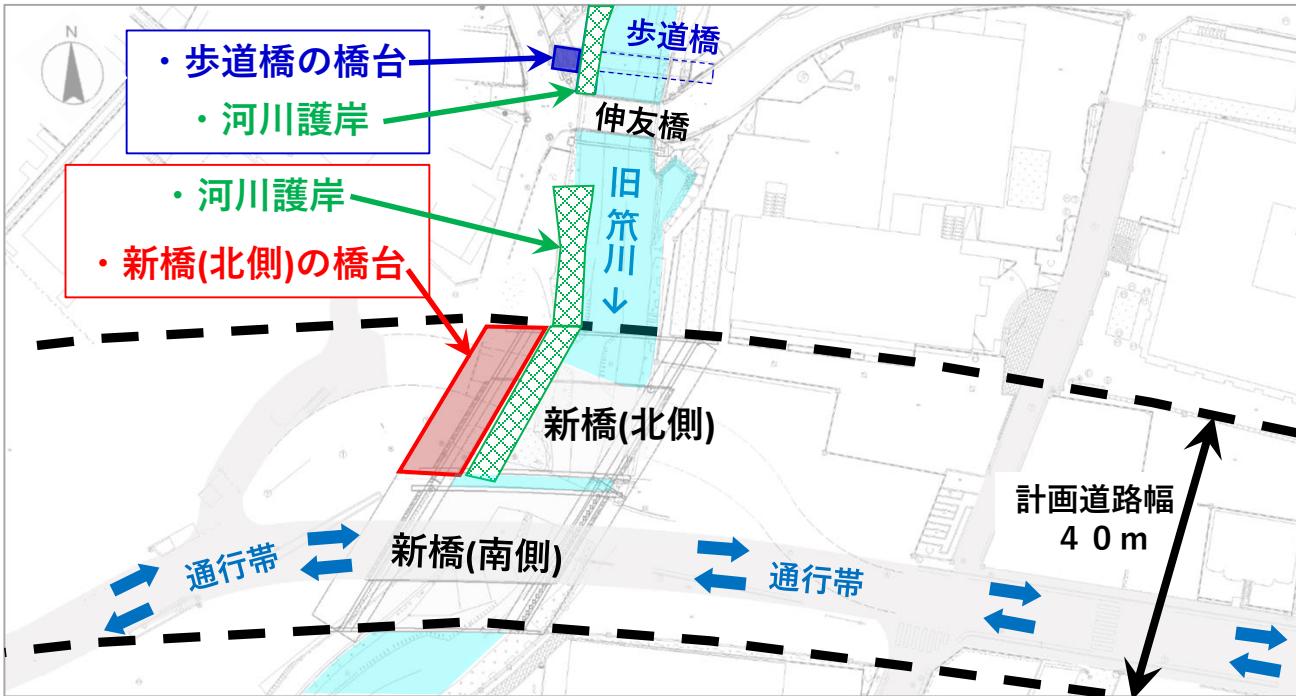

-----作業状況(撮影日:4月23日)-----



-----工事に関わる交通規制のご案内-----

・新橋(北側)及び伸友橋歩道橋の工事については、作業区域を確保するため、**周辺の道路を「終日交通規制」**しながら作業を行なっています。  
 ・交通規制は、**車両のみを通行止め**とし、**歩行者は昼夜問わず通行可能**です。  
 ※詳細な規制日程や迂回路は、規制箇所付近の案内看板をご確認ください。

-----工事内容及びスケジュール-----

工種	内容	施工時期
① 仮橋撤去	仮橋を撤去します	令和6年12月
② 橋台新設(掘削)	新橋の橋台範囲を掘削します	令和7年1～2月
③ 橋台新設(鉄筋)	橋台の骨組みとなる鉄筋を組み立てます	令和7年2～3月
④ <b>橋台新設(打設)</b>	<b>コンクリートを打設し橋台が完成します</b>	<b>令和7年3～5月</b>
⑤ <b>護岸整備</b>	<b>橋台の前面に護岸を整備します</b>	<b>令和7年5月予定</b>
⑥ 雑工・後片付け	現場内の仕上げ、事務所及び看板類の撤去を行います	令和7年6～7月予定

完了  
 ↓  
 施工中

※ 建設重機や大型トラックの往来により、**作業騒音や振動など、皆様にはご迷惑をお掛けしますが、引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。** (..)

**お問い合わせ先** 4月から担当者が変わりましたので、よろしくお願いいたします。

○事業全般に関して(発注者) 仙台市 建設局道路部 南道路建設課 **今野** 武者 (☎022-214-8409)  
 ○工事施工に関して(施工業者) ライブディック株式会社 相澤(現場代理人) (☎022-393-9750)

