

地域の皆様には、日頃より公共事業にご協力とご理解いただき、心より感謝申し上げます。

《工事概要》

本工事は、国道286号バイパス（南赤石工区）整備事業の一環として、(市)湯元上原線において道路拡幅改良工事を施行するものです。

《進捗状況》

4月中旬より掘削工に着手し残土の搬出を行っています。8月以降も引き続き残土の搬出作業を行います。

進捗写真 【北から南側を撮影】
(上空から撮影) R1.5.30



進捗写真 【北から南側を撮影】
(上空から撮影) R1.7.20



約2か月で約4m道路が下がりました。

車両識別表示板
設置状況
(車両前面に設置)

湯元上原線
道路改良工事
株深松組 No.01



掘削地山の状況
(現在は岩盤が現れています)




土曜日、日曜日、祝日の残土搬出は行いません。
6月～7月の1日のダンプ搬出台数は、35～60台でした。8月～9月は60台程度(15台×4往復程度)で搬出予定です。
残土搬出に際しては、運転者の安全教育を徹底し、安全運行に努めます。

《工事の順序》

下図の『 ~ 』の順序で左右交互に山を掘削して道路の位置を下げる予定です。


掘削予定

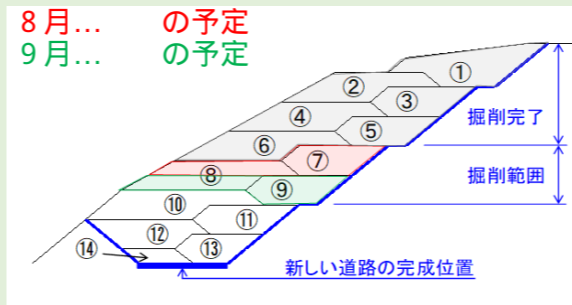

残土の積み込み状況




掘削作業中の交通規制
(片側交互通行)

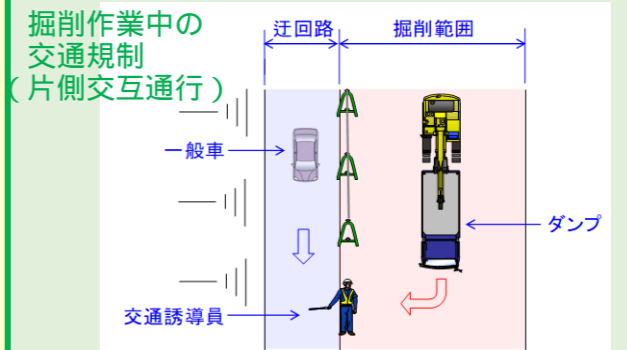

掘削作業中の規制状況



《工事中の道路規制》

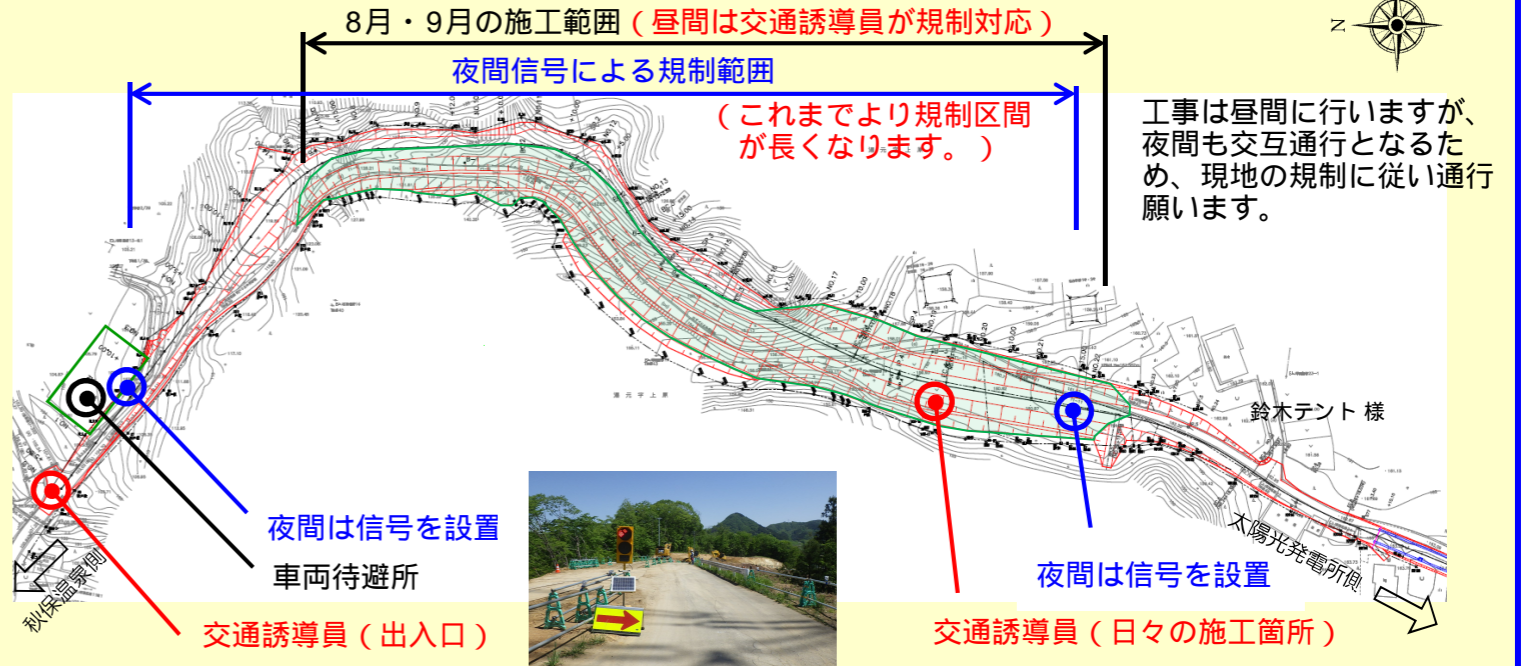

地域の皆様にはご不便やご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。交通安全には万全を期しますが、お気づきの点などございましたら、気軽にご相談いただくと幸いです。
お問い合わせ先：深松組 022-393-6571 現場代理人 相澤 070-2011-1166
監理技術者 田村 080-5744-9117

『道路工事だより』は2ヶ月毎に予定しています。
