

(国) 457号 馬橋架替え整備事業 工事だより


地域の皆さまには日頃より仙台市政ならびに本工事にご理解・ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

このたび、令和6年11月より進めてまいりました橋台工事が完成しましたのでお知らせいたします。また、地域の皆さまのご協力により、本工事を『無事故無災害』で進められた事に重ねて感謝申し上げます。

今後は、上部工工事で橋桁や橋梁路面の仕上げ、橋梁前後の道路改良工事を順次進めていく予定です。

地域住民の皆様には、もうしばらくの期間ご不便やご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解・ご協力をお願いいたします。

【工事の場所】

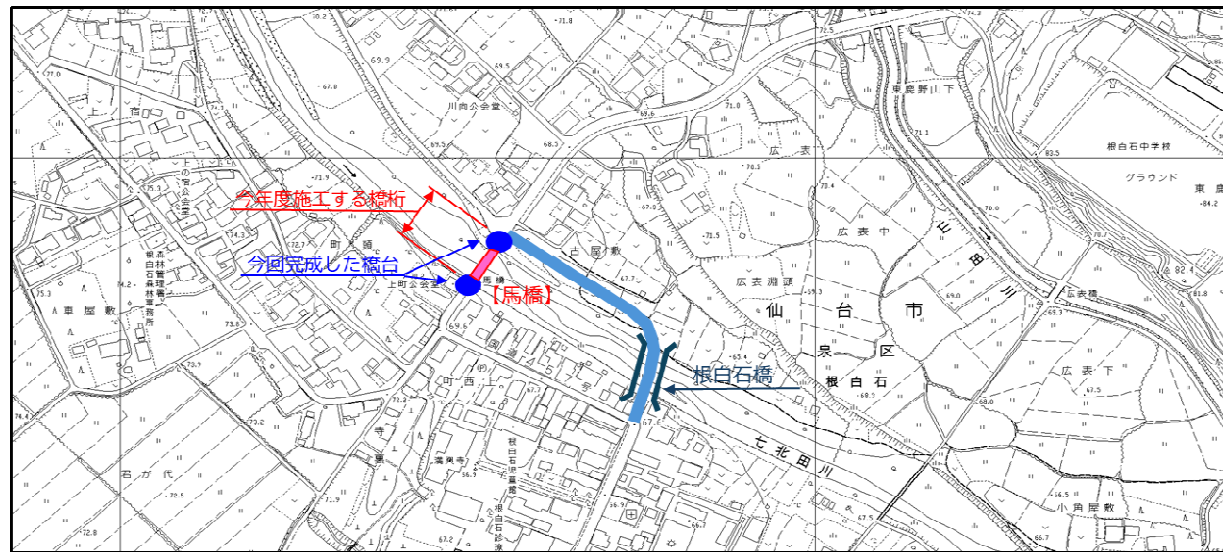

【架け替え橋(馬橋)の概要】

側面図



【事業に関するお問い合わせ・工事の発注者】

仙台市 泉区 建設部 道路課 道路建設係
担当：佐々木、武田 TEL：022-372-3111(内線6443)

工事の進捗状況

橋台工事が完成しました(A1橋台・A2橋台)




A1橋台(町頭側)完成



A2橋台(古屋敷側)完成

橋台工事完了までの流れ(A1橋台・A2橋台)

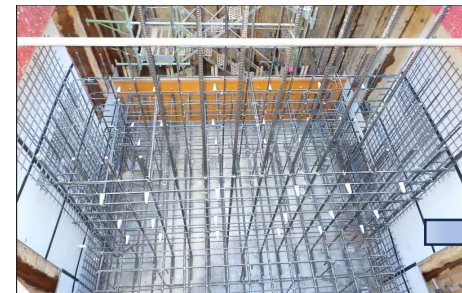

鉄筋組立て状況です。



コンクリートの打設状況です。



土留鋼矢板撤去状況です。



護岸ブロック積の作業状況です。



ブロック張りの作業状況です。



仮橋の撤去状況です。

【事業スケジュール】

		5年度	令和6年度		令和7年度	
		11月～5月	6月～10月	11月～7月	7月～10月	11月～3月
馬橋 (架替え)	旧橋撤去工事		完了			
	下部工工事			A1・A2橋台完了		
	上部工工事			(工場製作)		桁橋架設

※馬橋の架替え工事は、河川内での作業になるため、11月から5月末までの渇水期施工となります。

現地の工事再開は、令和7年11月以降になります。次号は、上部工工事の施工業者より、工事スケジュールや橋桁架設の流れなどについて、お知らせいたします。

【工事に関するお問い合わせ・工事の施工業者】

(株)ナスキー TEL：022-355-5248(本社)
担当：櫻井 携帯：080-9434-6644

