

この工事だよりは、仙台市のホームページでご覧いただけます。


「くらしの情報」 → 「住みよい街に→交通・道路」 → 道路 → 道路工事などのお知らせ → 工事のお知らせ(若林区、太白区、東部復興道路)




◆◆阿久戸橋の架け替え工事の今後の予定をお知らせします◆◆

- ・工事件名：郡山折立線(大野田工区)橋梁上部工工事
- ・工事会社：東日本コンクリート 株式会社
- ・工事期間：令和6年3月15日まで(令和6年6月まで延期予定)
- ・作業内容：阿久戸橋の土台となる橋台に橋桁を架け、前後の道路を構築し、交通を仮橋から切替えます。
- ・作業の流れ(予定)


①：橋桁製作, ②護岸整備

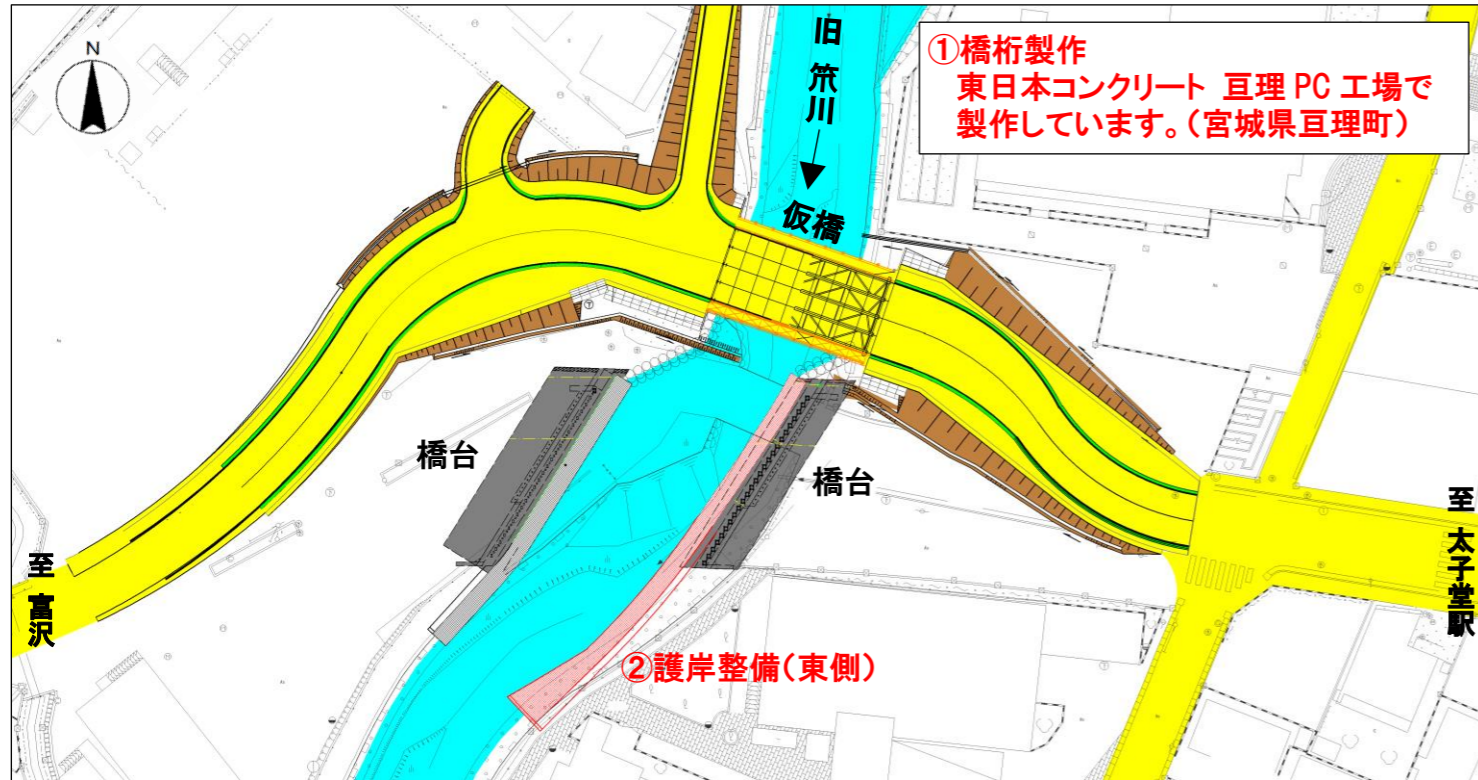

③：橋桁の運搬, ④橋桁の架設, ⑤横組工(橋桁の連結), ⑥橋梁付属物工

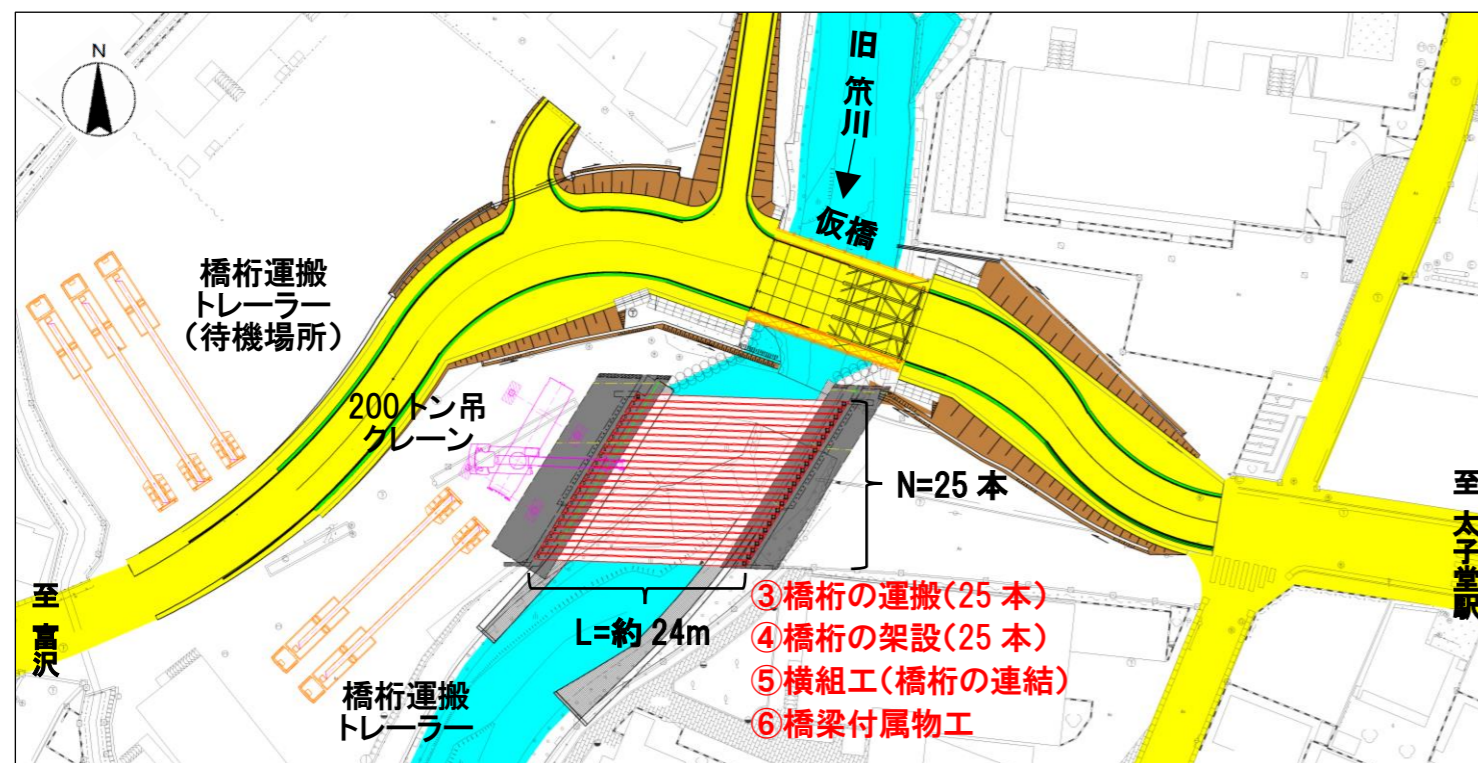

⑦：盛土工, ⑧舗装工, ⑨交通切替え

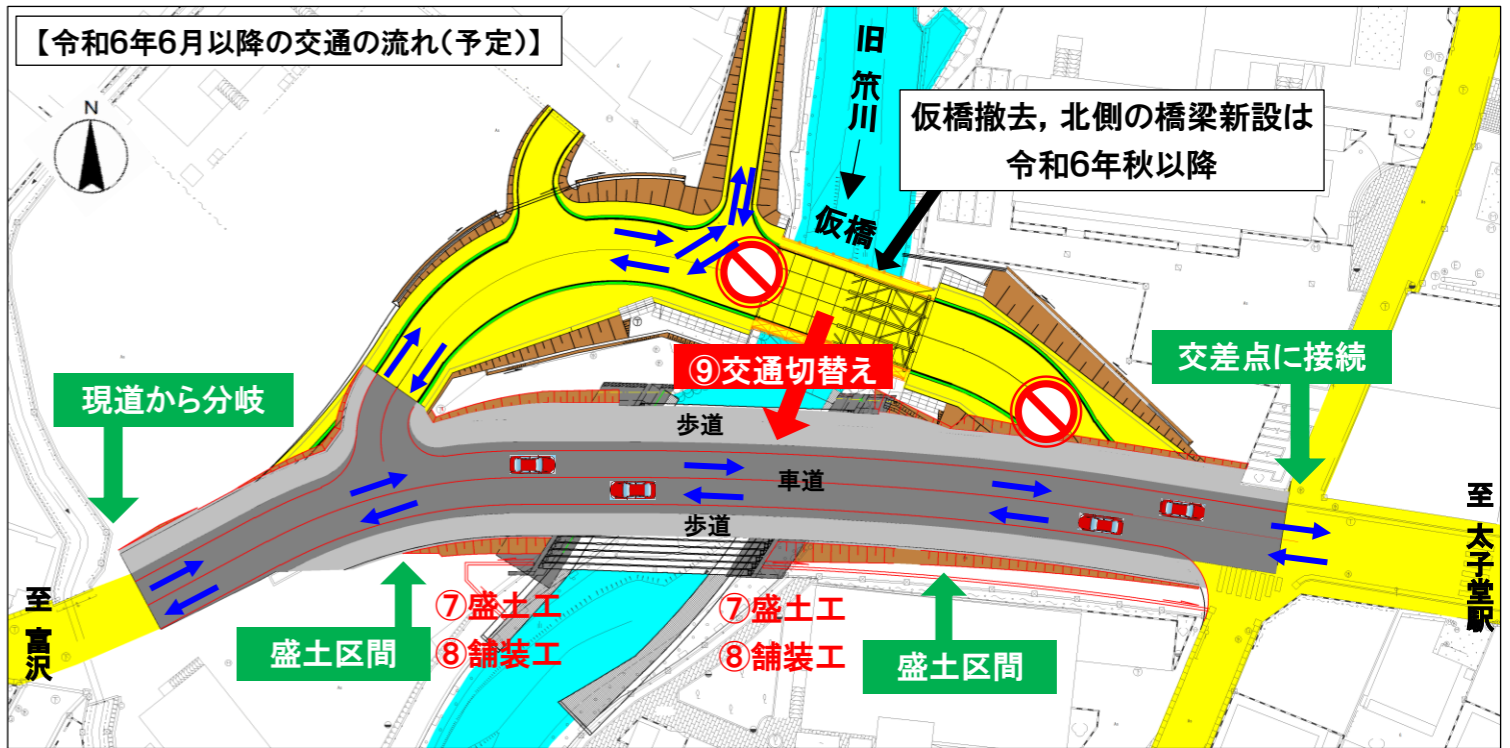

・整備イメージ写真



①橋桁製作(亘理町の工場) ②護岸整備 ③橋桁の運搬(亘理町→現場) ④橋桁の架設



⑤横組工(橋桁の連結) ⑥橋梁付属物工 ⑦盛土工 ⑧アスファルト舗装工

・整備スケジュール(予定)

	令和5年				令和6年					
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
①橋桁製作(25本)	■	■	■	■						
②護岸整備(東側)					■	■	■	■	■	■
③橋桁の運搬, ④橋桁の架設, ⑤横組工, ⑥橋梁付属物工						■	■	■	■	■
⑦盛土工, ⑧舗装工, ⑨交通切替え【工事完了】									■	■

●お問い合わせ先

- ・事業に関して(発注者)：仙台市 建設局道路部 南道路建設課 道路第二係 松田・篤 (☎022-214-8409)
- ・橋梁工事に関して(施工業者)：東日本コンクリート 株式会社 伊藤(現場代理人) (☎022-225-4425)
