



～ 新年あけましておめでとうございます ～


かねてより本事業へのご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

本事業におきましては、昨年より最後の橋梁下部工工事に着手しており、橋梁部の完成に一步步近づいてきております。

今後とも一日も早い事業の完了・道路の開通に向け努めて参りますので、本年も変わらぬご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

-----工事の進捗状況を報告します-----

## 北側新橋 施工状況

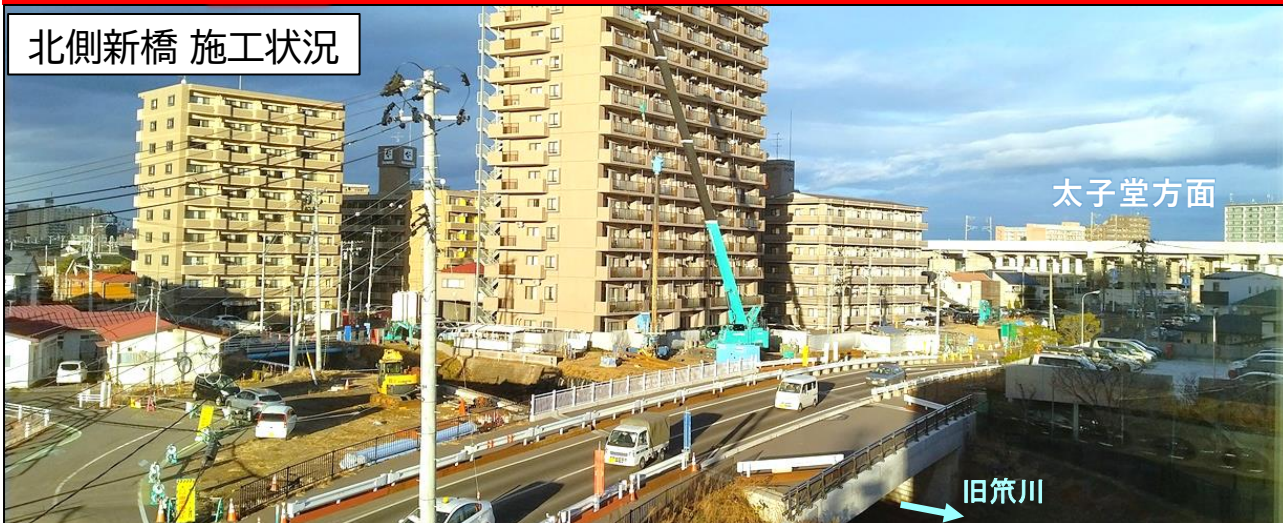

	工 種	内 容
①	準備工	工事着手の準備等を行います 完了
②	橋台新設(土留・掘削)	土留設置(鋼矢板圧入等)後に掘削します ← 施工中
③	橋台新設(鉄筋)	橋台の骨組みとなる鉄筋を組み立てます
④	橋台新設(打設)	コンクリートを打設し橋台が完成します
⑤	護岸整備	橋台の前面に護岸を整備します
⑥	後片付け	現場事務所及び看板類を撤去します

令和7年12月から、北側新橋(東側)の土留設置(鋼矢板圧入等)を行っております。土留設置完了後、掘削・鉄筋組立・コンクリート打設・護岸工事等を順次実施してまいります。

-----各種関連工事を実施しています-----

新たな道路へのライフライン(下水道・水道・ガスなど)の埋設工事(本線北側)を、順次実施してまいります。(下水道工事については令和7年12月に着手済)

詳細については各工事ごと、近隣住民の皆様へ担当部署よりお知らせいたします。

## ライフライン工事予定

下水道：仙台市 建設局 管路建設課  
水道：仙台市 水道局 南配水課  
ガス：仙台市 ガス局 建設課  
通信：NTTインフラネット株式会社



## ◇◇地域の安全と快適な走行のための工事を予定しています◇◇

安全で快適に道路を走ることができるよう、幅員狭小部の改善を目的とした道路工事(暫定整備)を実施する予定としております。

工事期間中はご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

➤工事期間：令和8年3月頃～令和8年7月頃(予定)

➤工事内容：舗装工事、交通切り替え等

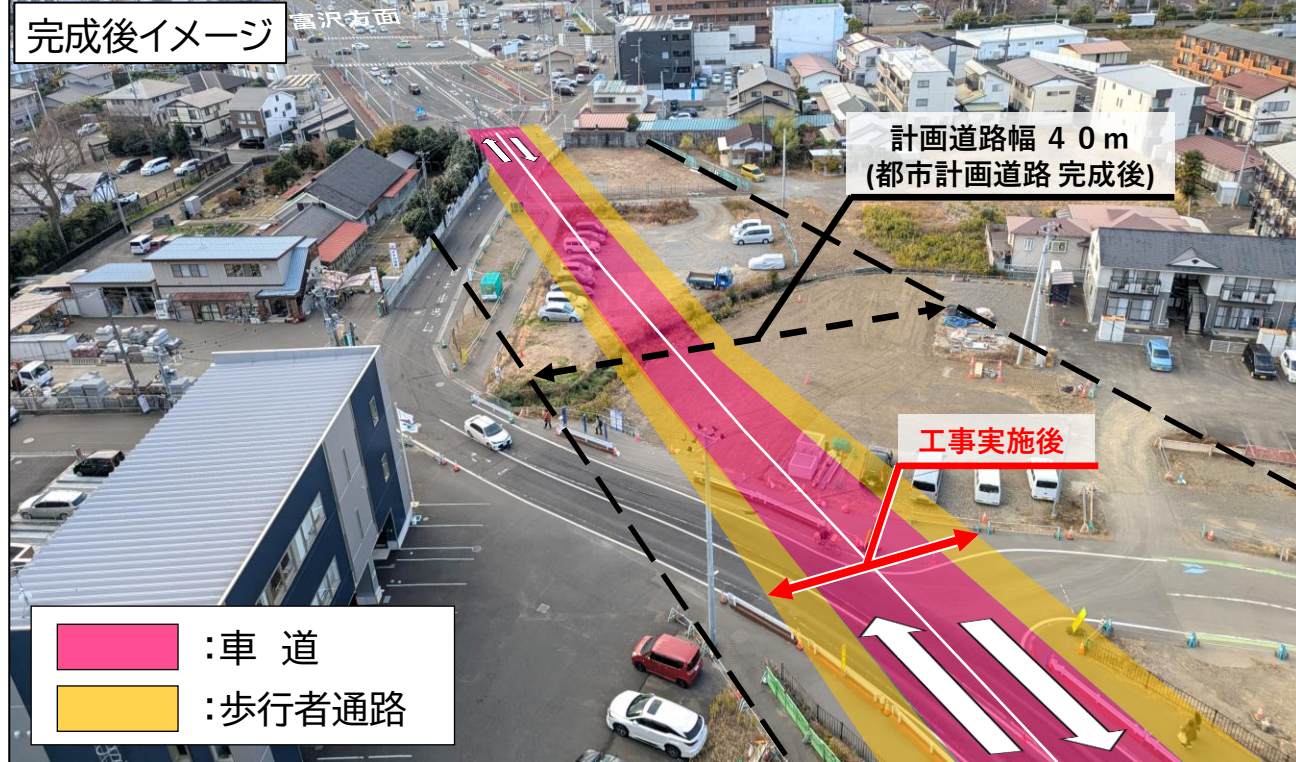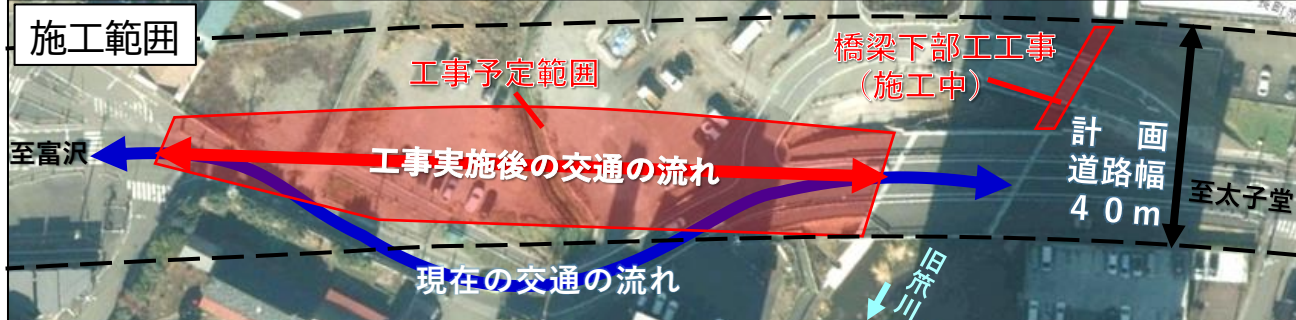

※実際の施工はイメージと異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

## 工事に関わる交通規制のご案内

工事の内容により、片側交互通行の交通規制を行いますので、ご協力をお願い致します。なお、歩行者・自転車は、昼夜問わず通行可能です。詳しい日程等については、現地の案内看板等にてお知らせいたします。

## お問い合わせ先

○事業全般に関して(発注者) 仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 今野・武者・菅原(☎022-214-8409)

○橋梁施工に関して(施工業者) 株式会社 広瀬組 庄子・猪瀬(☎022-392-4620)
