


この工事だよりは、市のホームページからご覧いただけます。
 『くらしの情報』
 > 『住みよい街に』交通・道路
 > 『道路』道路工事などのお知らせ
 > 工事のお知らせ(若林区、太白区、東部復興道路)



-----橋梁下部工工事の進捗状況を報告します-----

現在、**北側新橋**および**伸友橋 東側**では、橋の土台を造っています。また、**伸友橋 西側**で護岸ブロック設置作業等を実施しています。渇水期(11月～5月)に河川内工事を完成させる必要があるため、**土曜日・祝日**に作業を行っており、皆様にはご不便をおかけしておりますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

➤ **工事の完成時期** : 令和8年7月31日まで(予定)

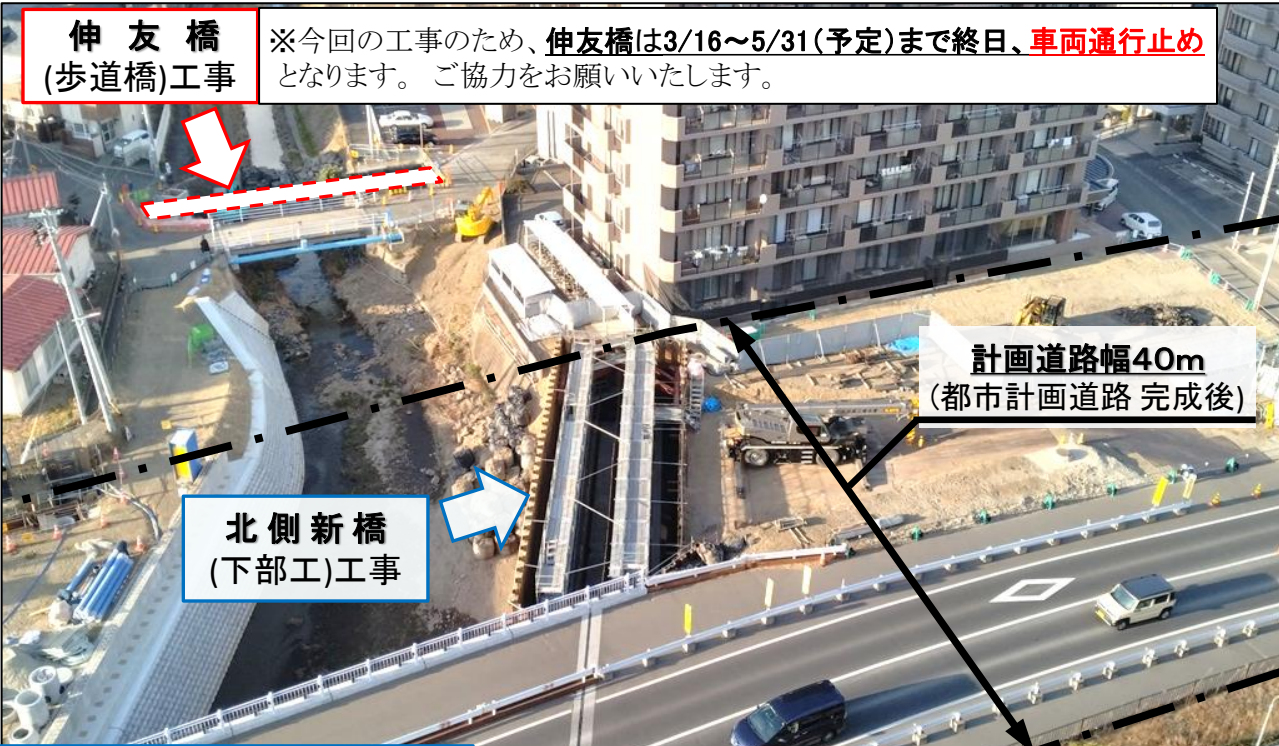

北側新橋(下部工)工事

工種	内容	完了
① 準備工	工事着手の準備等を行います	完了
② 橋台新設(土留・掘削)	土留設置(鋼矢板圧入等)後に掘削します	完了
③ 橋台新設(鉄筋)	橋台の骨組みとなる鉄筋を組み立てます	← 施工中
④ 橋台新設(打設)	コンクリートを打設し橋台を造ります	
⑤ 護岸整備	橋台の前面に護岸を整備します	
⑥ 後片付け	現場事務所及び看板類を撤去します	

-----各種関連工事を実施しています-----

新たな道路への**ライフライン**(下水道・水道・ガスなど)の埋設工事(本線北側)を、**順次実施**してまいります。(下水道工事については令和7年12月に着手済) 詳細については各工事ごと、近隣住民の皆様へ担当部署よりお知らせいたします。

ライフライン工事予定


下水道 : 仙台市 建設局 管路建設課
 水道 : 仙台市 水道局 南配水課
 ガス : 仙台市 ガス局 建設課
 通信 : NTTインフラネット株式会社

◇◇地域の安全と快適な走行のための工事を行っています◇◇

安全で快適に道路を走ることができるよう、**幅員狭小部の改善**を目的とした**道路工事(暫定整備)**を実施いたします。

工事期間中はご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

➤ **工事期間** : 令和8年3月から令和8年7月31日まで(予定)
 ➤ **工事内容** : 舗装工事、交通切り替え 等

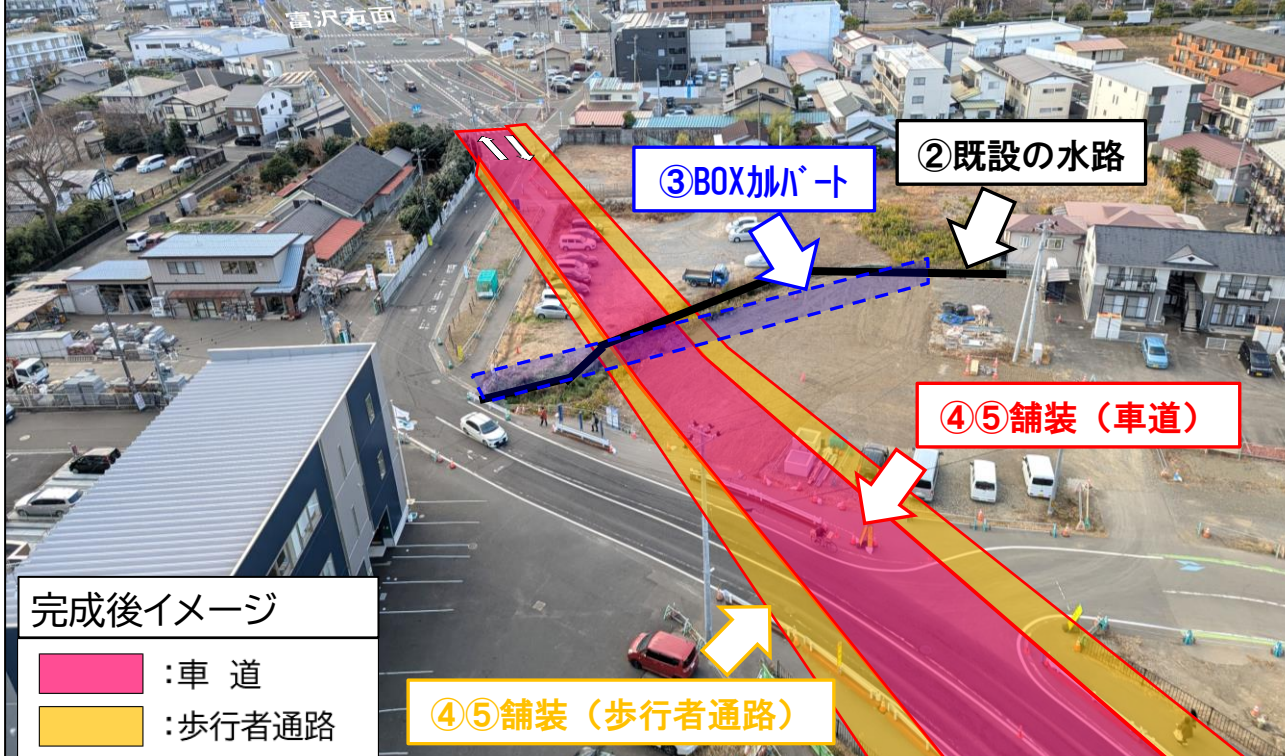

※実際の施工はイメージと異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

工種	内容	完了
① 準備工	工事着手の準備等を行います	完了
② 構造物の撤去	既設の水路を撤去します	3月下旬頃～
③ BOXカルバート設置	水路撤去した場所にBOXカルバートを設置します	
④ 舗装準備	舗装をするために、地面を掘削し砕石で整地します	4月下旬頃～
⑤ 舗装(車道・歩道)	アスファルト舗装し、白線などの区画線を引きます	5月中旬頃～
⑥ 後片付け	現場事務所及び看板類を撤去します	7月上旬頃～

-----工事に関わる交通規制のご案内-----

4月下旬～6月下旬(予定)の期間中、**該当する日程のみ**、現在ご利用いただいている道路と交差する箇所において**片側交互通行**による交通規制を行います。なお、**歩行者・自転車は、昼夜を問わず通行可能**です。詳しい日程等については、現地の案内看板などでお知らせします。

お問い合わせ先

○事業全般に関して(発注者) 仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係 (☎022-214-8409)
 ○橋梁施工に関して(施工業者) 株式会社 広瀬組 庄子・猪瀬 (☎022-392-4620)
 ○道路工事に関して(施工業者) 株式会社 朋栄土木 木村(☎022-393-4215)
