


# 工事のお知らせ

地域の皆様には、日頃より市政に対し、ご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。  
 1月現在までの施工状況ですが、工事も終盤に差し掛かって参りました。  
 橋台は2基ともほぼ完成し、A1側(八木山側)は土の埋戻しに入り、今月中に完了します。  
 また、A2側(ひより台側)も2月から土の埋戻しに入り、全体の工事完了は2月末を予定しております。

地域の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、振動・騒音等の低減に努力し、工事を進めてまいります。また、今後も引き続き、歩行者の安全確保のため、周辺道路の除雪や融雪作業を適宜行ってまいります。

工事に関して、気になる点・ご要望等ありましたら、恐れ入りますが、現場担当までご連絡願います。

## 施工箇所

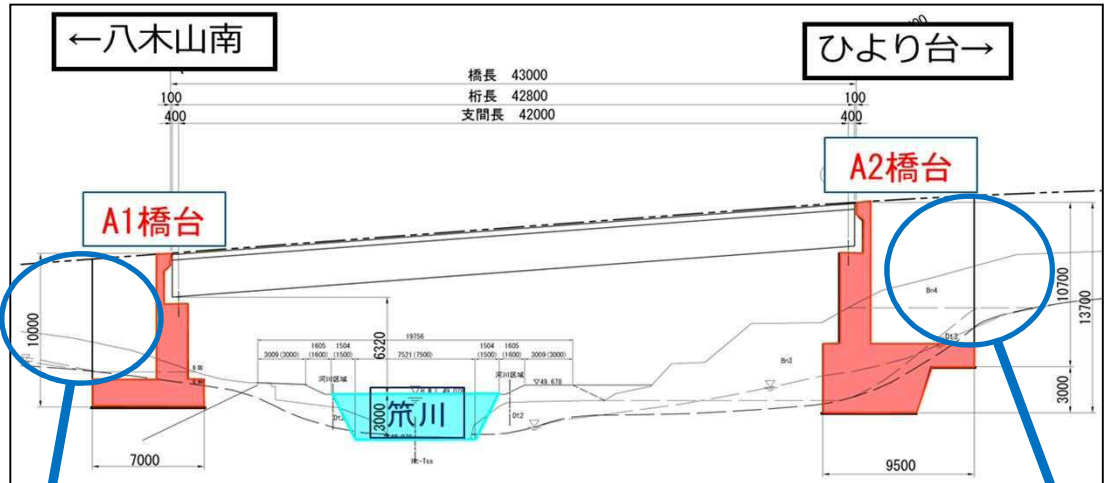

橋台の完成後、土の埋戻し作業中です。



今後、橋台の足場解体作業に入ります。

## 施工写真

強風による飛散防止のため、敷鉄板・防塵シートによる仮囲いの点検・整備を常に行っております。

周辺道路・歩道の除雪を行っています。

歩行者の安全確保のため、融雪作業を行っています。

## 今後の施工予定表

工種	種別	※今後の施工部分					
		10月	11月	12月	1月	2月	
準備工	保安工・測量等	[ ]					
作業土工	埋戻				[ ]		
橋台工	鉄筋・型枠・コンクリート	[ ]			[ ]		
仮設工	作業用通路・敷鉄板片付け	[ ]					
道路土工	盛土・地下排水				[ ]	[ ]	
片付け						[ ]	

## 問い合わせ

◎施工業者 株式会社 広瀬組  
 担当者：猪瀬 雄一  
 連絡先：携帯 090-7931-4979

◎発注者 仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係  
 担当者：加藤 泰輔  
 連絡先：TEL 022-261-1111 (内線4736)
