

皆様には、日ごろ公共事業にご協力とご理解をいただき、心より感謝申し上げますと共に  
来る年の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。どうぞ良いお年をお迎えください。

《工事概要》

本工事は、国道286号バイパス（南赤石工区）整備事業の一環として、(市)湯元上原  
線において道路拡幅改良工事を施行するものです。

《進捗状況》

4月中旬より掘削工に着手し 現在、56%程度完了しています。12月以降も引き続  
き残土の搬出作業を行います。

進捗写真【南から北側を撮影】  
(上空から撮影) R1.9.19



進捗写真【南から北側を撮影】  
(上空から撮影) R1.11.22



約2か月  
で約2m  
道路が下  
がりました。

土曜日、日曜日、祝日の残土搬出は行いません。  
10月～11月の1日のダンプ搬出台数は、54～72台でした。12月～1月は60台程  
度(10台×6往復程度)で搬出予定です。  
残土搬出に際しては、運転者の安全教育を徹底し、安全運行に努めます。



タイヤ泥落とし状況



一部側溝設置しました


《お知らせ》

年末・年始工事の休止について  
令和元年12月28日～令和2年1月5日(年末年始休暇9日間)は休工とし、ダンプ  
の搬出は行いません。  
工事期間延長について  
令和2年1月末を目標に進めてまいりましたが台風等悪天候の際に、工事車両が路面を  
汚さないように土砂運搬を控えたため、令和2年3月末まで工事期間を延長致します。

《工事の順序》

下図の『 ~ 』の順序で左右交互に山を掘削して道路の位置を下げる予定です。


掘削予定

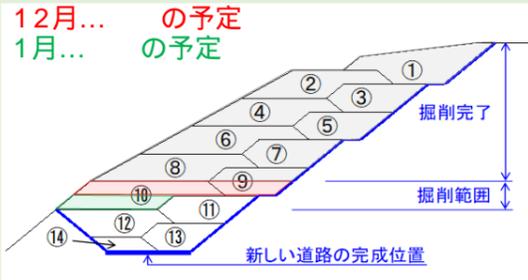

残土の積み込み状況



掘削作業中の  
交通規制  
(片側交互通行)

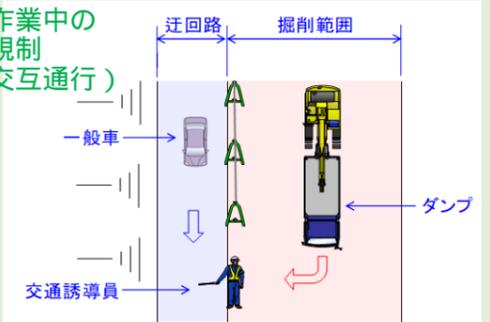

掘削作業中の規制状況



《工事中の道路規制》



地域の皆様にはご不便やご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。交通安全  
には万全を期しますが、お気づきの点などございましたら、気軽にご相談いただくと幸いです。  
お問い合わせ先：深松組 022-393-6571 現場代理人 相澤 070-2011-1166  
監理技術者 田村 080-5744-9117
