


# 工事のお知らせ

## (主)仙台山寺線(舟木南)歩道設置工事(その2)

地域の皆様には、日頃より道路工事に対し、ご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。令和3年3月から4月末までは、掘削工事・排水工事・法面吹付工事・法枠工事を行ってまいりました。令和3年5月からは法面吹付工事及び法枠工事が主な作業となる予定です。工事に関して、お気づきの点・ご要望等がございましたら、恐れ入りますが下記現場担当までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

### 位置図

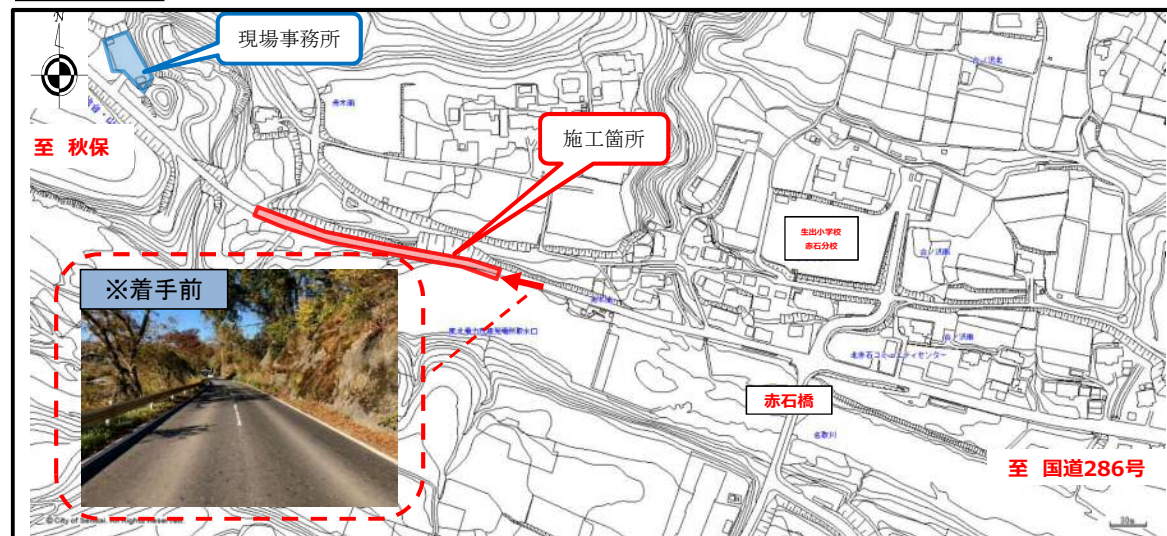

### 工程表

工種	R2, 8月	9月	10月	11月	12月	R3, 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
掘削工	■										■			
吹付工・法枠工						■					■			
排水構造物工	■										■			
切土防護柵撤去工													■	
舗装工														■
片付け														■

### ●工事期間の延長について

前回のお知らせ第8号(令和3年2月)では、工事期間について、令和3年7月末までとしておりましたが、法面補強のための法枠工事の増工により、**令和3年9月末まで延期する予定**となりました。地域住民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き安全に十分配慮し工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。



#### 工事に関するお問い合わせ先

◎施工者 株式会社 高工  
現場代理人：櫻井 敏矢  
連絡先：TEL 022-297-3344(携帯080-3691-3610)

#### 事業に関するお問い合わせ先

◎発注者 仙台市 建設局 道路部 南道路建設課 道路第二係  
担当者：木村 静輝  
連絡先：TEL 022-261-1111 (内線4736)



### 令和3年 3月・4月 工事内容

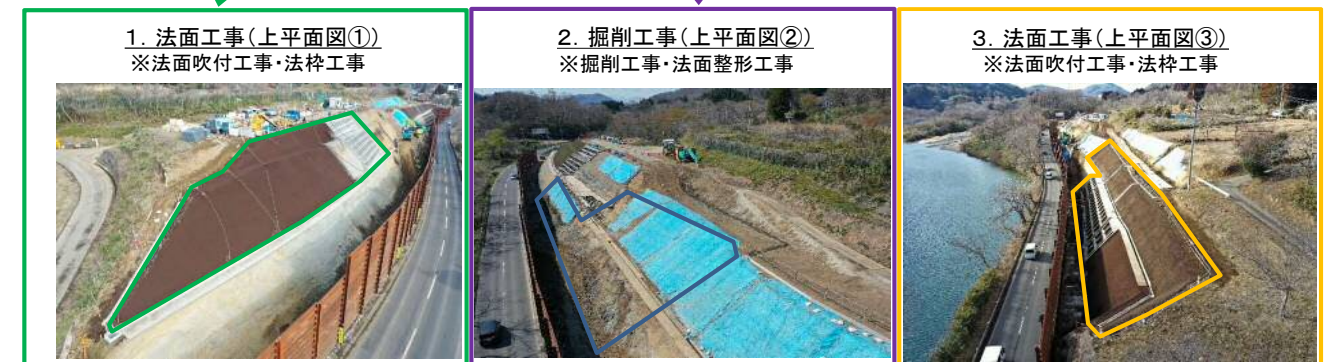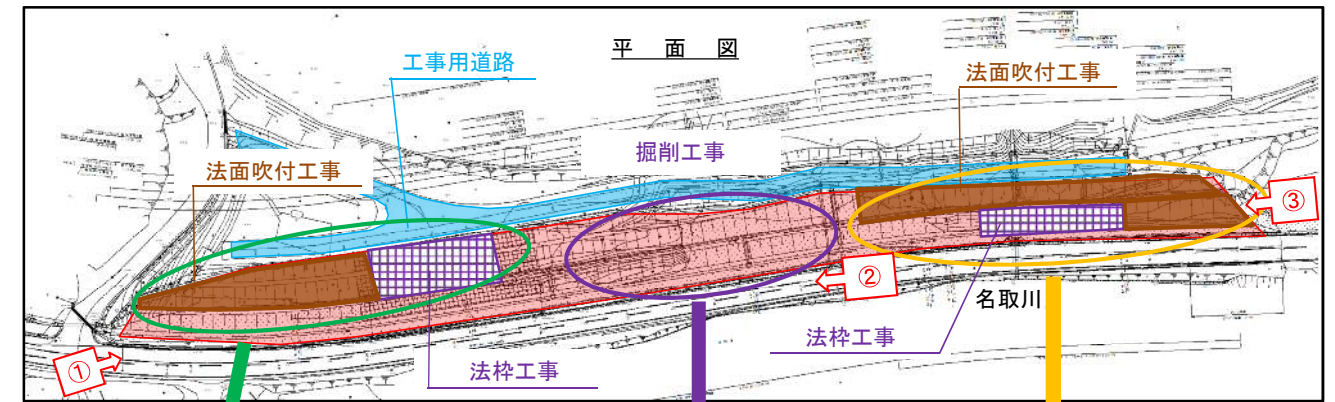

### 令和3年 5月・6月 工事予定内容

法面吹付工事・法枠工事を行ってまいります。

※平面図 吹付・法枠工事施工予定箇所

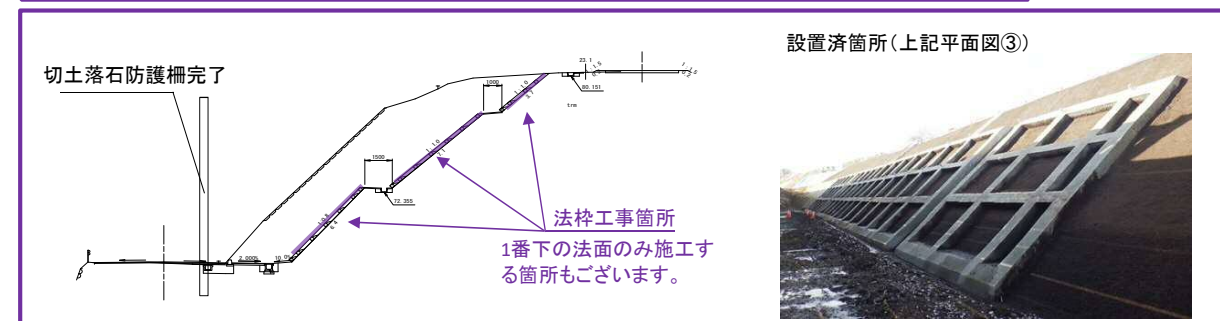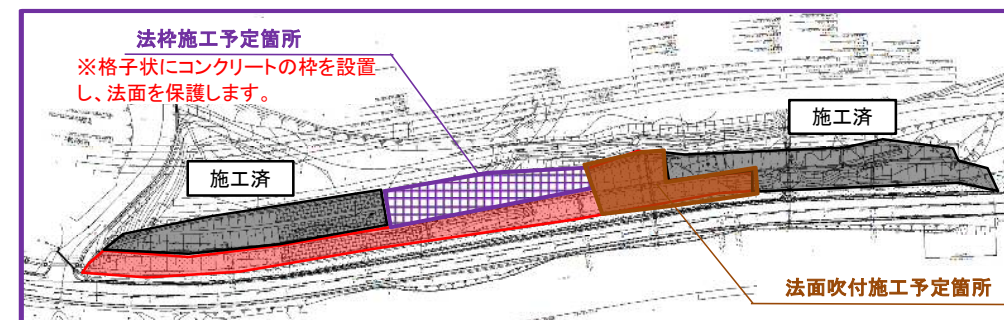

### お知らせ

5月ゴールデンウィーク明けから片側交互通行となるお知らせしておりましたが、工期の延期に伴い片側交互通行の時期も変更となります。詳しい期間・内容につきましては次回の「工事のお知らせ 第10号」にて記載させていただきます。
