

皆様には、日ごろ公共事業にご協力とご理解をいただき、心より感謝申し上げます。

《工事概要》

本工事は、国道286号バイパス（南赤石工区）整備事業の一環として、(市)湯元上原線において道路拡幅改良工事を施行するものです。

《進捗状況》

昨年より掘削工に着手し 現在、工事は85%程度完了しています。引き続き残土の搬出作業を行い4月末で完了する予定です。

進捗写真 【南から北側を撮影】
(上空から撮影) R2.1.10



進捗写真 【南から北側を撮影】
(上空から撮影) R2.3.10



約2か月
で約1m
道路が下
がりました。

土曜日、日曜日、祝日の残土搬出は行いません。

2月～3月の1日のダンプ搬出台数は、30～84台でした。4月以降は30台程度（5台×6往復程度）で搬出予定です。

残土搬出に際しては、運転者の安全教育を徹底し、安全運行に努めます。



進捗写真 【北から南側を撮影】



側溝設置状況

《お知らせ》

ゴールデンウィーク時の休止について

令和2年4月29日～令和2年5月6日（ゴールデンウィーク休暇 8日間）は休工となります。

工事期間延長について


令和2年3月末を目標に進めてまいりましたが降雨・降雪等悪天候の際に、工事車両が路面を汚さないように土砂運搬を控えたことにより、土砂運搬作業に日数がかかったため、令和2年6月末まで工事期間を延長致します。

《工事の順序》

下図の『 』の順序で左右交互に山を掘削して道路の位置を下げる予定です。

掘削予定

4月... の予定（4月で完了予定）

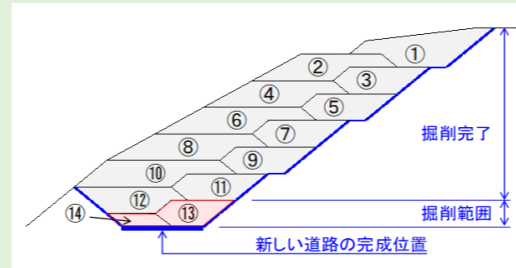

残土の掘削状況



残工事の予定

	4月	5月	6月
掘削・残土搬出	■		
側溝設置作業	■	■	
法面保護作業		■	■
舗装作業			■


掘削作業中の規制状況



《工事中の道路規制》

4月・5月の施工範囲（昼間は交通誘導員が規制対応）

夜間信号による規制範囲(これまでと同じ規制区間です。)

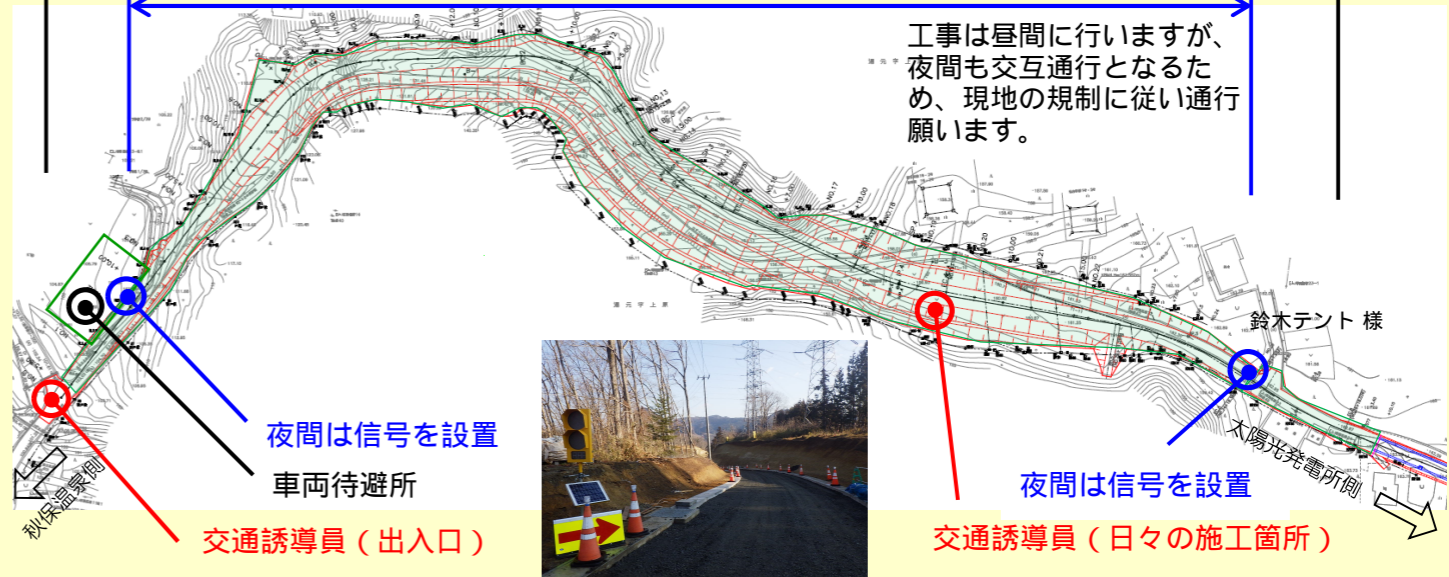

工事は昼間に行いますが、夜間も交互通行となるため、現地の規制に従い通行願います。

夜間は信号を設置
車両待避所

夜間は信号を設置

交通誘導員（出入口）

交通誘導員（日々の施工箇所）

地域の皆様にはご不便やご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。交通安全には万全を期しますが、お気づきの点などございましたら、気軽に相談いただくと幸いです。

お問い合わせ先：深松組 022-393-6571 現場代理人 相澤 070-2011-1166

監理技術者 田村 080-5744-9117

『道路工事だより』は2ヶ月毎に予定しています。
