資料　3

第72回
杜の都の環境をつくる審議会

平成28年2月3日

仙台市建設局百年の杜推進課

報告事項（１）

ふるさとの杜再生プロジェクトについて

東部地域のみどりの成り立ち

- 仙台湾特有の景観形成は、仙台城築城等の建材運搬の目的で運河を開削し、運河沿いにクロマツを植栽したことによりはじまる。沿岸部のクロマツ林は、慶長５年(1600年)の着手以降、約400年に渡り、海岸防災林としての機能に加え、沿岸部の特徴的な海浜景観を形成していた。

<u>主なみどりの被災状況</u>

- 市内の海岸林387.2haのほぼ全てが被災
- 沿岸地域の農地1,860haが被災
- 沿岸地域の居久根が５地区で被災
- 津波浸水区域の樹林地率13%から2.4%に低下

■東部地域のみどりの再生

市民・NPO・企業等の力を結集し、海岸防災林や海岸公園、居久根等、かつて東部地域の風景をなし、また、復興の過程で、新たに生まれるみどりの再生・創造への取組みを進めます。

百年の杜づくり
仙台市

ふるさとの杜
再生プロジェクト

海岸公園再整備事業

■再整備の趣旨

被災施設の復旧と防災機能の確保

・津波で被災した施設の復旧を進めるとともに、避難の丘の整備により、防災機能を確保し、来園者がより安全で快適に利用できるよう再整備を行う。

新たな賑わい・交流の創出

・新たな機能の追加などにより、多くの人々が海や自然と触れ合える魅力的な交流エリアとして再生を図り、復興のシンボルにふさわしい公園としていく。

【海岸公園のゾーンニング】

※赤丸 ● は 避難の丘

■再整備のスケジュール

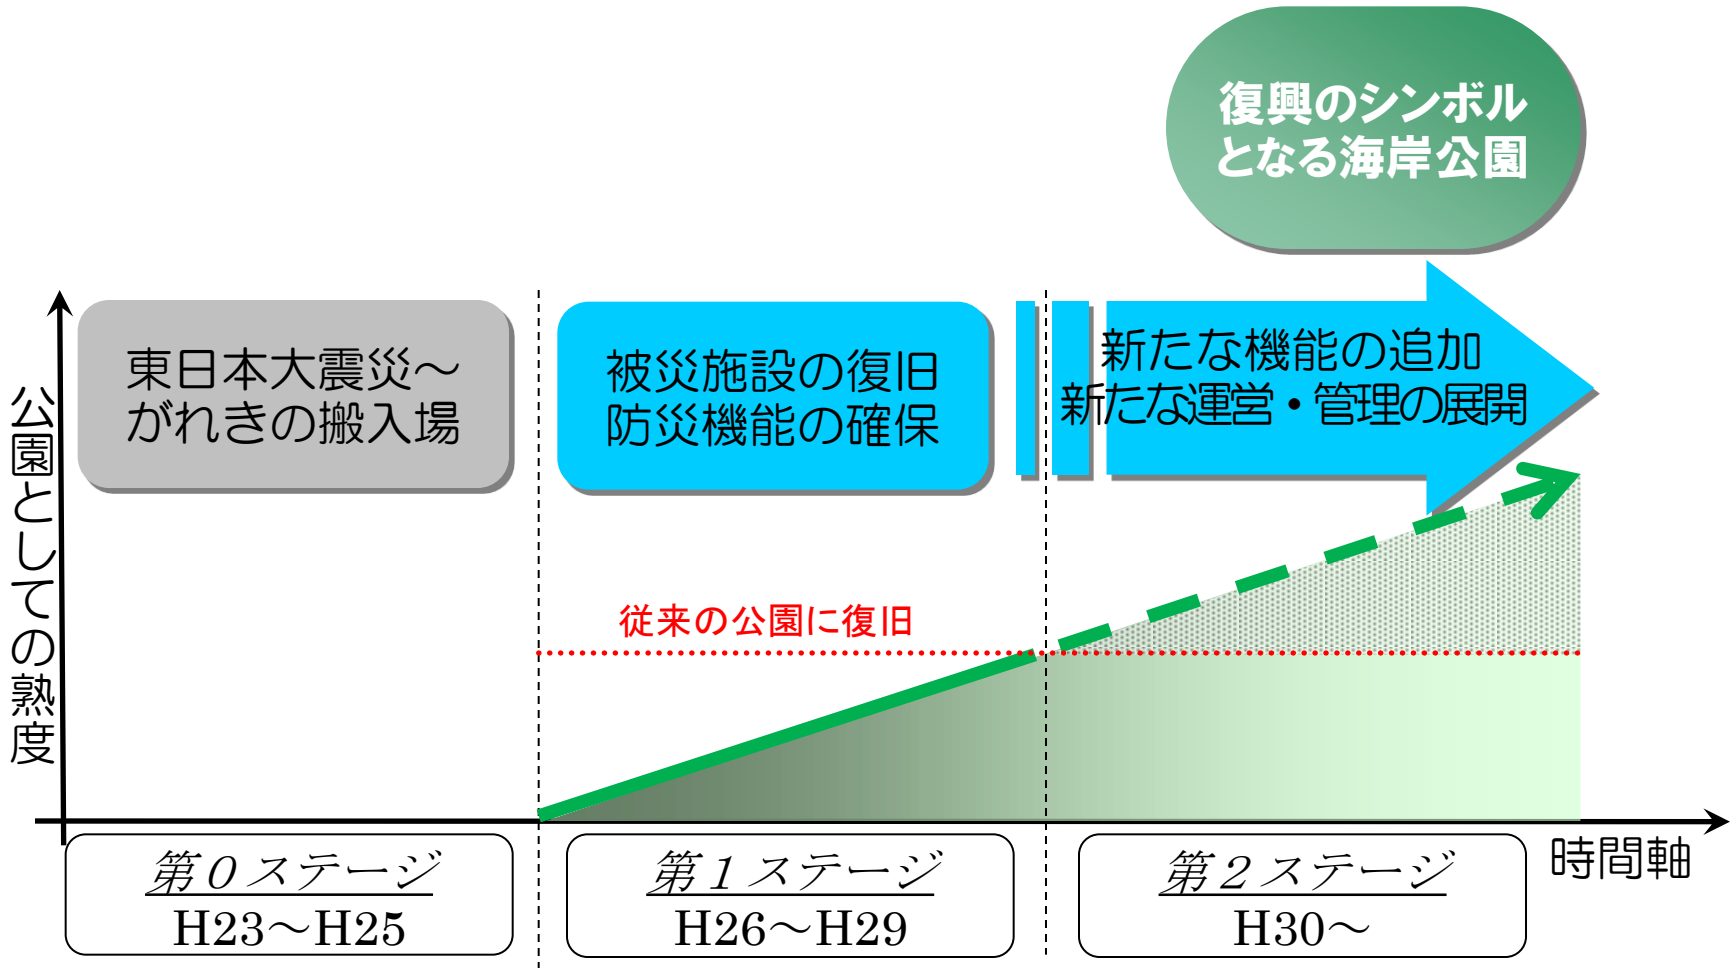
復興のシンボル
となる海岸公園
東日本大震災～
がれきの搬入場
被災施設の復旧
防災機能の確保
新たな機能の追加
新たな運営・管理の展開
公園としての熟度
従来の公園に復旧
時間軸
第０ステージ
H23～H25
第１ステージ
H26～H29
第２ステージ
H30～

■施設復旧の現状

蒲生地区（17ha）

・平成26年11月に着手した少年野球場は平成28年3月末の完成を目指し施行中。
・平成27年度実績…野球場4面・テニスコート10面・クラブハウスの復旧に着手済み。
　避難の丘整備中。
・当地区の事業完了（第1ステージ分）は平成29年3月末を見込んでいる。

荒浜地区（9ha）

・平成26年11月に着手した芝生運動場1面とパークゴルフ場23ホールは平成28年7月末
　の完成を目指し施行中。
・平成27年度実績…園路・駐車場・センターハウス・クラブハウスの復旧に着手済み。
　避難の丘整備中。
・当地区の事業完了（第1ステージ分）は平成29年3月末を見込んでいる。

■施設復旧の現状

井土地区（10ha）

・現在、当地区内において、農水省による二郷堀導水路整備工事が早期の完了を目指し施行中。
・平成27年度実績…馬術場・デイキャンプ場・管理棟の復旧は平成28年3月に着手予定。避難の丘整備中。
・当地区の事業完了（第1ステージ分）は平成30年3月末を見込んでいる。

藤塚地区（1.5ha）

・災害復旧の対象となる施設は無い。
・平成27年度実績…避難の丘整備中。
・当地区の事業完了（第1ステージ分）は平成29年3月末を見込んでいる。

ふるさとの杜再生プロジェクト

■プロジェクトの目的･･･　東部地域におけるみどりの再生･創出

活動の３本柱

　市民によって提供された樹木で、市民が植樹を行い、市民が維持管理（手入れ）を行っていきます。

植える･･･参加する市民自らの手で植樹を行います。
育てる･･･参加する市民自らの手で植樹後の維持管理活動を行います。
支える･･･樹木や資金の寄付･提供を通じ、ふるさとの杜の再生を支えます。

植栽樹種等の調査検討

■植栽ゾーニング　※蒲生地区・荒浜地区

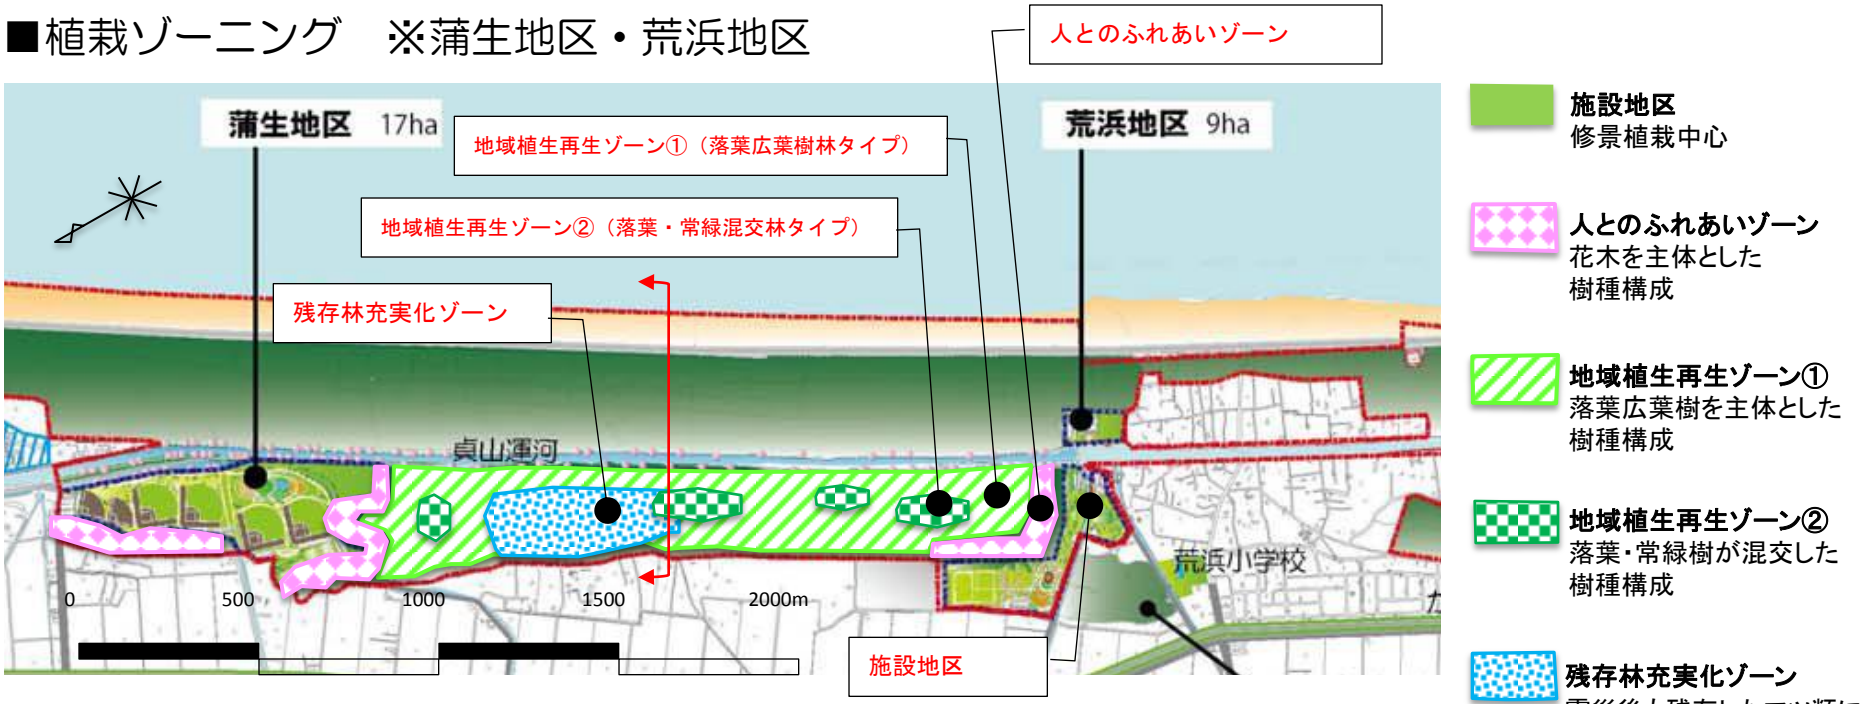

■植栽断面イメージ

プロジェクトの実施体制

プロジェクトへの市民参加のプラットホームとして、「ふるさとの杜再生プロジェクト連絡会議」を平成27年9月に設立。多様で多くの市民が参加できる市民協働プロジェクトの推進を図ります。

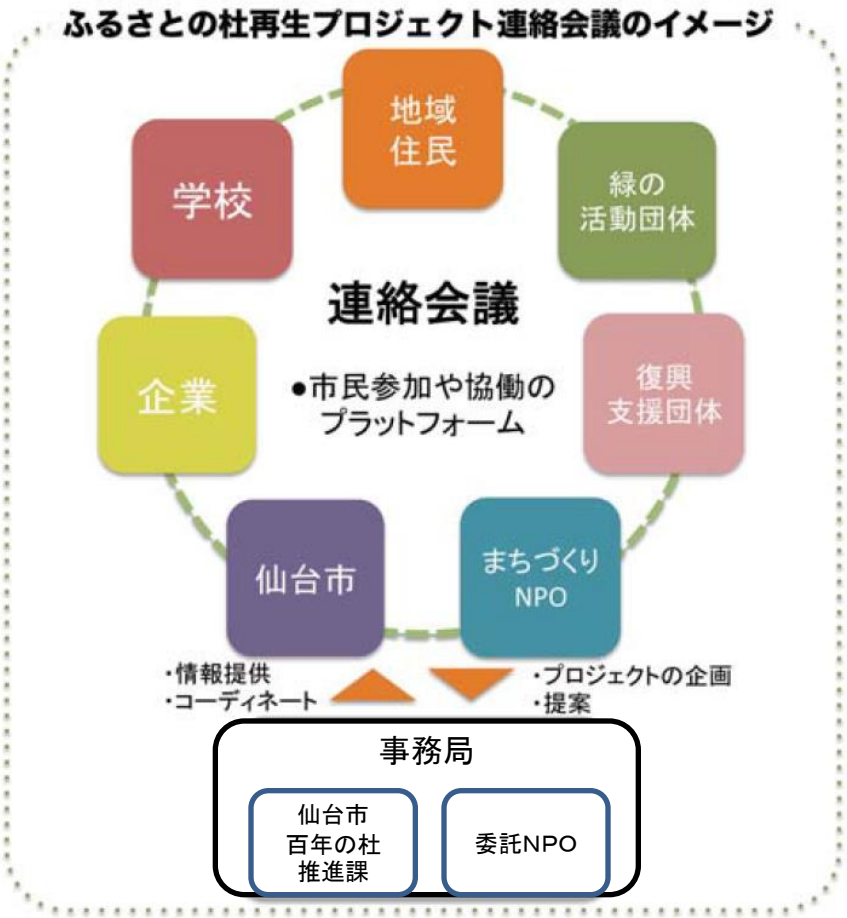

ふるさとの杜をフィールドとした各種団体の活動を円滑に進め、団体同士がともに連携し、活躍しやすくするための情報共有や調整、協議を行う場とします。

ふるさとの杜再生プロジェクト連絡会議

第１回（H27.9.7）
プロジェクトの状況報告、参加団体同士の情報共有

第２回（H27.11.30）
市民植樹開催の検討、参加団体のリソース・ネットワークの整理

第３回（H28.1.14）
地域住民・支援企業参加、現地視察（海岸防災林・海岸公園・居久根）、市民植樹企画検討状況の確認

連絡会議メンバーの活動

市民植樹
（仙台市開催）

学校でのどんぐりの苗木づくり
（仙台市公園緑地協会）

維持管理体験
(緑の活動団体)

基金への寄付
（支援企業）

フォーラム参加者の苗木づくり
（仙台市開催）

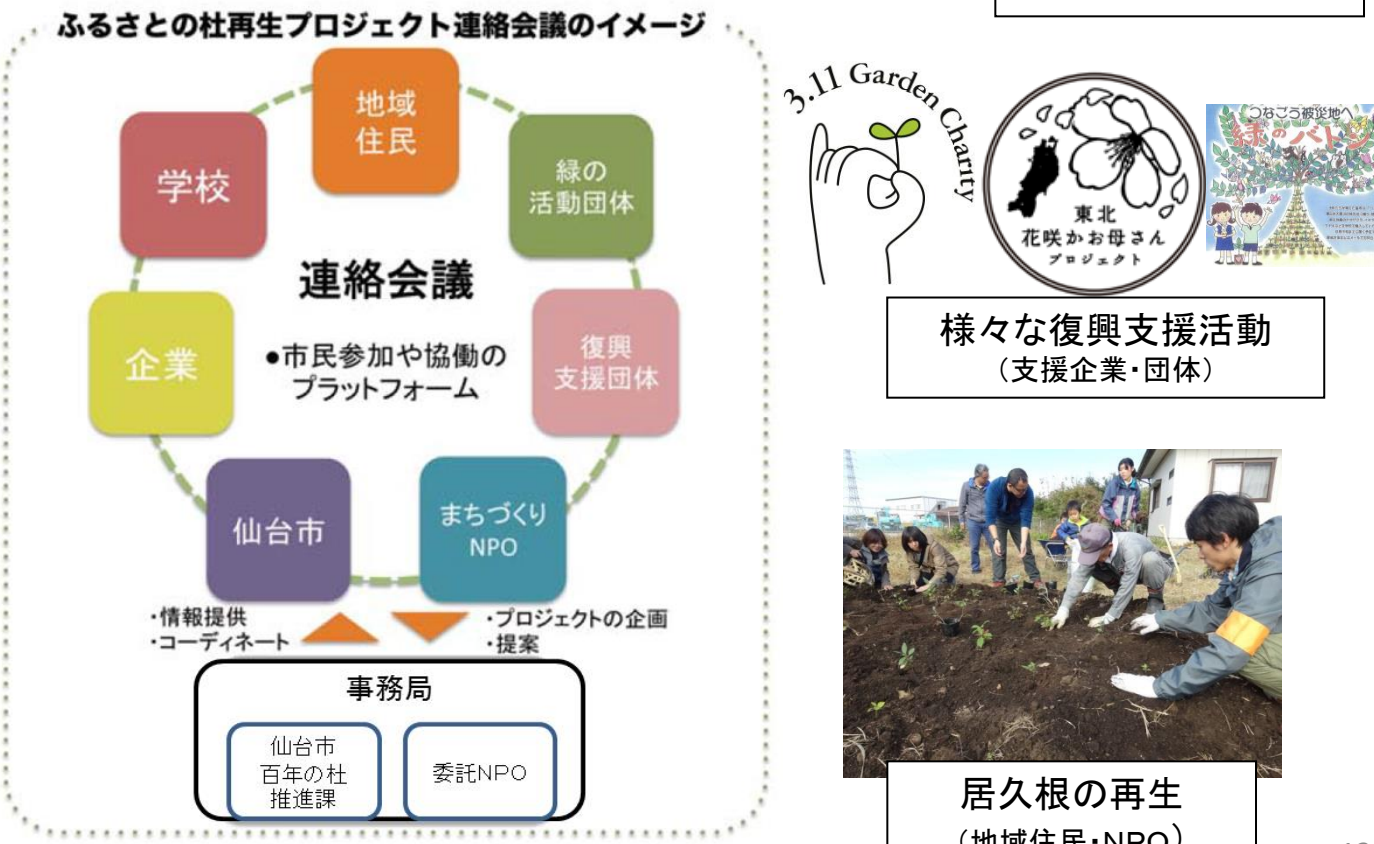

様々な復興支援活動
（支援企業・団体）

海外からの支援受入
（仙台市）

居久根の再生
（地域住民・NPO）

市民植樹の開催

■平成26年度実績（中野中央公園）

主催：仙台市
参加：中野小学校、緑の活動団体、支援企業、近隣店舗関係者他

緑の活動団体による植樹指導

近隣店舗スタッフも参加

市民植樹の開催

■平成27年度：蒲生地区（海岸公園施設整備地区）

H28年度以降は、海岸公園再整備の進捗に併せ、荒浜・井土・藤塚の各施設整備地区でも市民植樹を行う。

併せて、林野庁や宮城県と連携し、海岸防災林における展開も検討。
